



Koordinationsitzung zur Umsetzung der Massnahmen



Traktanden:

1. Massnahmen der 1. Generation in der Übersicht
2. Organisation Agglomerationsprogramm Solothurn
3. Leistungs- / Finanzierungsvereinbarungen
4. Umsetzungscontrolling gemäss ASTRA
5. Umsetzungsbericht fürs ARE
6. Aufgaben der Gemeinden
7. Varia

Referenten:

Amalia Schneider

Projektleiterin
Agglomerationsprogramme



Amt für Raumplanung

Stefan Gantenbein

Kantonsingenieur Stv.



Amt für Verkehr und Tiefbau


Traktanden:

1. Massnahmen der ersten Generation in der Übersicht
2. Organisation Agglomerationsprogramm Solothurn
3. Leistungs- / Finanzierungsvereinbarungen
4. Umsetzungscontrolling gemäss ASTRA
5. Umsetzungsbericht fürs ARE
6. Aufgaben der Gemeinden
7. Varia


1.1 Eingegangene Verpflichtungen mit dem Bund

Leistungsvereinbarung mit dem Bund zu den Massnahmen der 1. Generation:


- Massnahmen und Massnahmenpakete, A-Liste
- Eigenleistungen, Priorität A

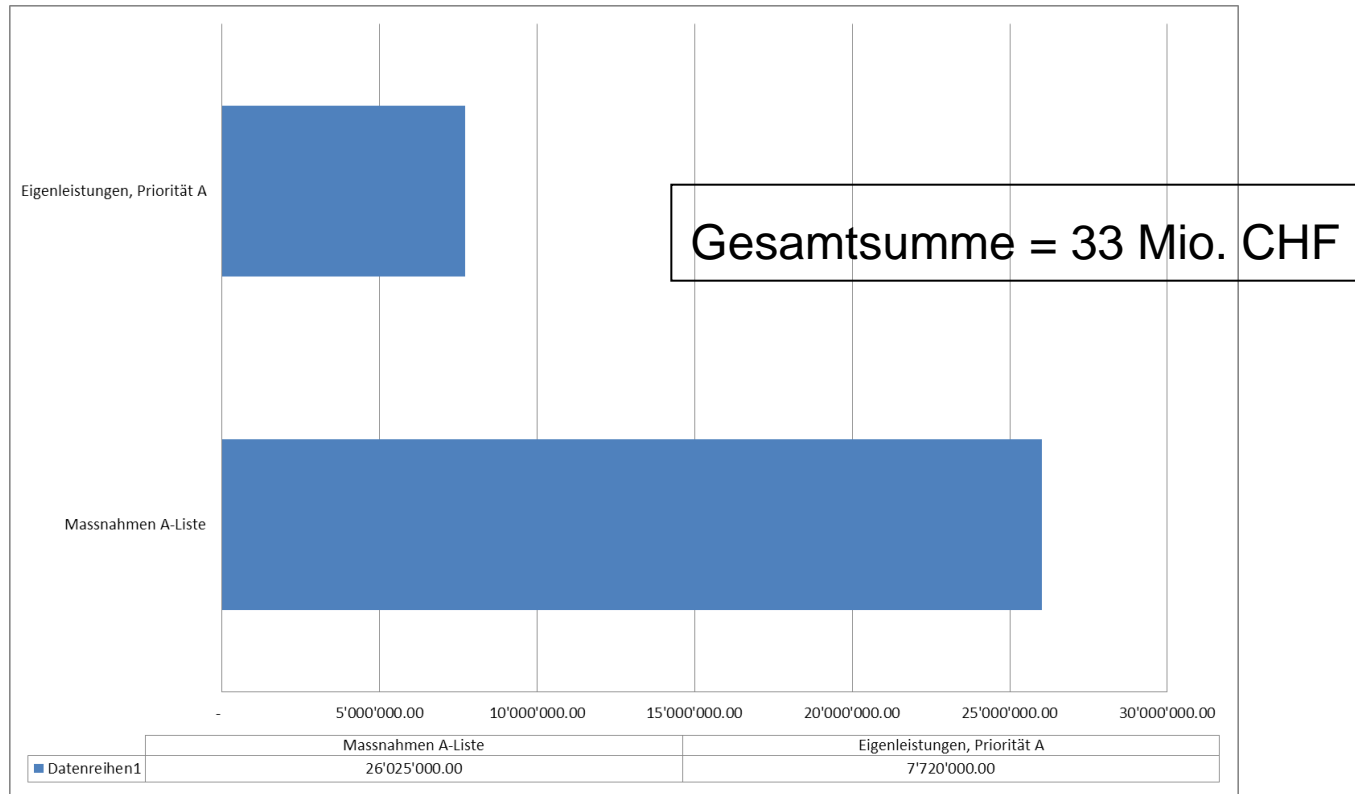

1.2 Massnahmen und Massnahmenpakete, A-Liste

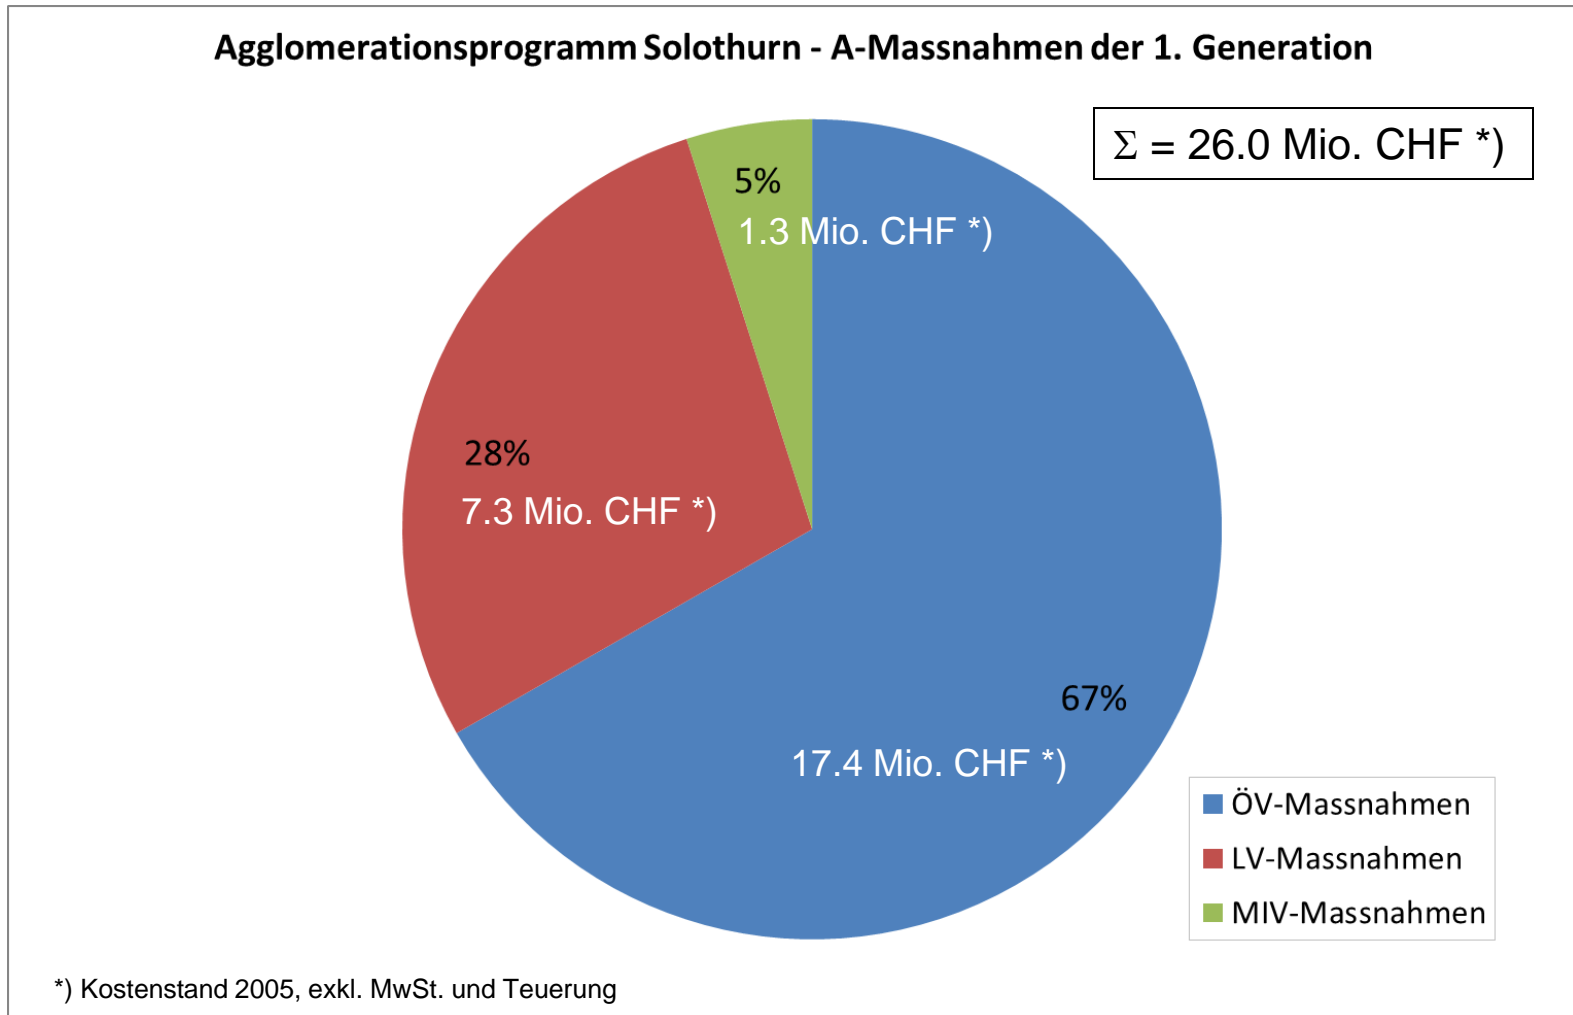

1.2 Massnahmen und Massnahmenpakete, A-Liste

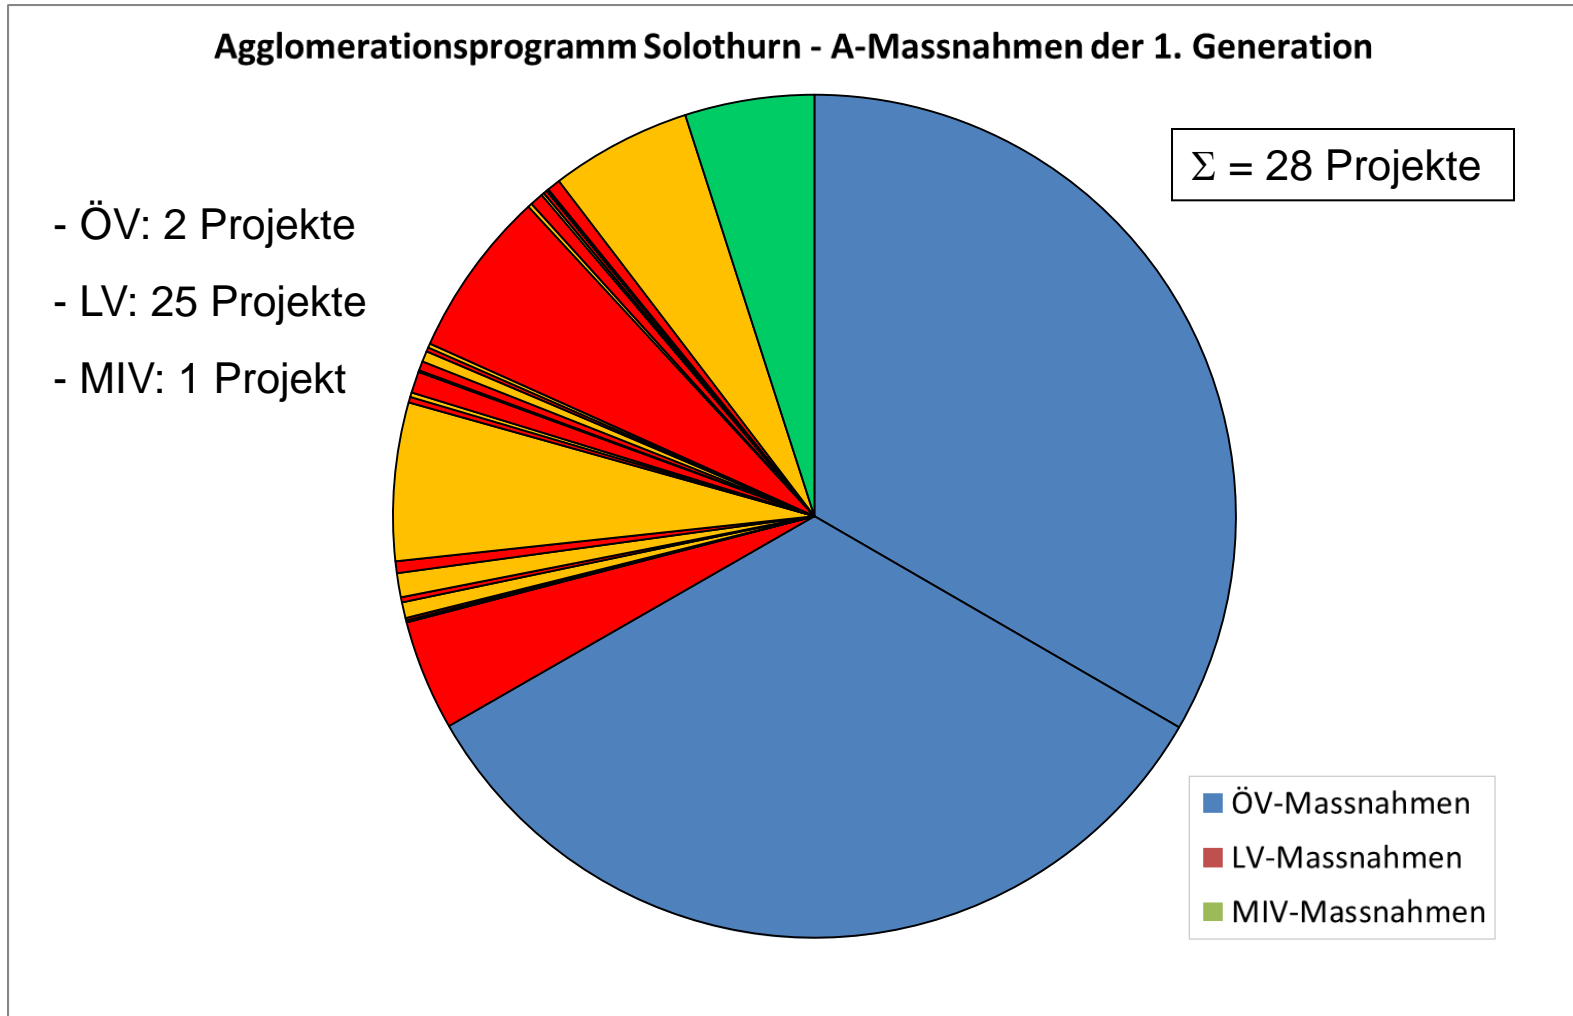

Neue Haltestellen Solothurn Brühl / Bellach Grederhof



Solothurn Brühl, Visualisierung Ansicht Süd

Leutwyler Partner Architekten

LV- Massnahme: Spatenstich Öschbrücke Subingen




Foto: Brucker/Würtrich, Olten

Spatenstich zum ersten LV-Projekt im Rahmen des Agglomerationsprogramms Solothurn. Das Projekt Öschbrücke in Subingen ist der erste Teil einer dann zumal durchgehenden Langsamverkehrsverbindung zwischen Solothurn und dem Äusseren Wasseramt, abseits von stark befahrenen Hauptstrassen. Sie wird dann zum sichereren Schulweg in Richtung des Oberstufenzentrums OZ13. An diesem historischen Moment mit dabei waren, von links nach rechts: Stefan Niggli, Leiter Kreis 1, Amt für Verkehr und Tiefbau Kanton Solothurn (AVT); Stefan Gantenbein, Stellvertretender Kantonsingenieur, (AVT); Vreni Zimmermann, Gemeindeschreiberin Subingen; Beat Rudolf von Rohr, Baupräsident Subingen; Markus Schwarzenbach, Bauführer FANWA-Bau; Walter Guldemann, Bauführer ASTRADA; Hans Ruedi Ingold, Gemeindepräsident Subingen; Urs Allemann, Ingenieurbüro Emch + Berger; Johannes Friedli, Präsident Repla espaceSOLOTHURN.

Traktanden:

1. Massnahmen der 1. Generation in der Übersicht
2. **Organisation Agglomerationsprogramm Solothurn**
3. Leistungs- / Finanzierungsvereinbarungen
4. Umsetzungscontrolling gemäss ASTRA
5. Umsetzungsbericht fürs ARE
6. Aufgaben der Gemeinden
7. Varia

Organigramm

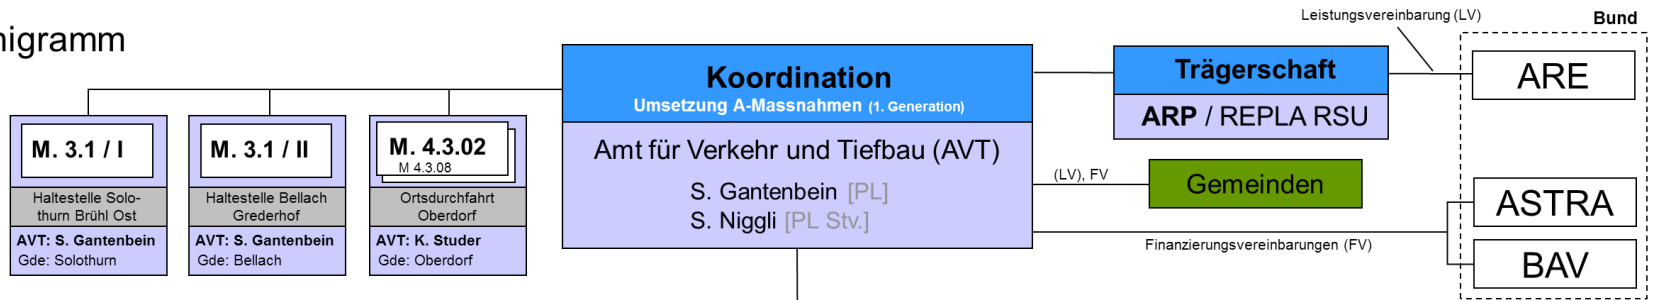

M5: Massnahmen Langsamverkehr

AVT: S. Niggli / S. Gantenbein / K. Erni

M5.1 Erhöhung der Sicherheit auf Kantonsstrassen

M. 5.1.01 M 5.1.02 / M 5.1.16 A/E 4.3.04 - 4.3.06	M. 5.1.05	M. 5.1.07 M. 5.3.10	M. 5.1.08	M. 5.1.9 M 5.2.11 / M 5.3.05	M. 5.1.11	M. 5.1.12	M. 5.1.14
Günsbergstrasse	Kreisel Tell	Kreisel L.-Rütli	Kreuz, Derend.str.	Hauptstr./Waldweg	Bolacker Gerlafinst.	Sportfeld-/Grüttstr.	Rüttenenstrasse
AVT: K. Studer Gde: Hubersdorf, Riedholz	AVT: K. Studer Gde: Bellach	AVT: D. Zoller Gde: Luterbach	AVT: D. Zoller Gde: Luterbach	AVT: D. Zoller Gde: Derendingen	AVT: D. Zoller Gde: Gerlafingen	AVT: D. Zoller Gde: Gerlafingen	AVT: K. Studer Gde: Langendorf


M5.2 Alternativrouten auf Strassen mit geringem MIV

M. 5.2.02	M. 5.2.03	M. 5.2.04	M. 5.2.06	M. 5.2.07	M. 5.2.08	M. 5.2.09	M. 5.2.10	M. 5.2.15
Derendingen-Subingen	Subingen-Kriegstetten	Nennigkofen - Lüsslin. - Solothurn	Zuchwil - Luterbach	Wiladingenstrasse	Solothurn - Selzach	Subingen - Derendingen Süd	Feldbrunnen - Riedholz	Signalisation
AVT: xxx Gde: Derendingen, Subingen, Zuchwil	AVT: xxx Gde: Subingen, Oekingen, Kriegstetten	AVT: xxx Gde: Biberist, Lüss., Nennigkofen, Solothurn	AVT: xxx Gde: Luterbach, Zuchwil	AVT: xxx Gde: Recherswil	AVT: xxx Gde: Solothurn, Bellach, Selzach	AVT: xxx Gde: Subingen, Derendingen	AVT: xxx Gde: Feldbrunnen, Riedholz	AVT: xxx Gden im Wasseramt


M5.3 Verbesserung der Zugänge zu den öV-Haltepunkten für den Fussgänger

M. 5.3.01	M. 5.3.03	M. 5.3.04	M. 5.3.06	M. 5.3.07	M. 5.3.08	M. 5.3.09
Lommiswil: Querung Dorfstr.	V-Beruhigung Oberdorf	Feldbrunnen: asm-Haltestelle	Einmündung Neuquartierstrasse	Gerlafingen: Haltestelle Fluryhof	Hagmannstrasse-Überführungsstr.	Bahnhof Solothurn West
AVT: xxx Gde: Lommiswil	AVT: xxx Gde: Oberdorf	AVT: xxx Gde: Feldbrunnen	AVT: xxx Gde: Biberist	AVT: xxx Gde: Gerlafingen	AVT: xxx Gde: Recherswil	AVT: xxx Gde: Solothurn

05.04.2011/gan

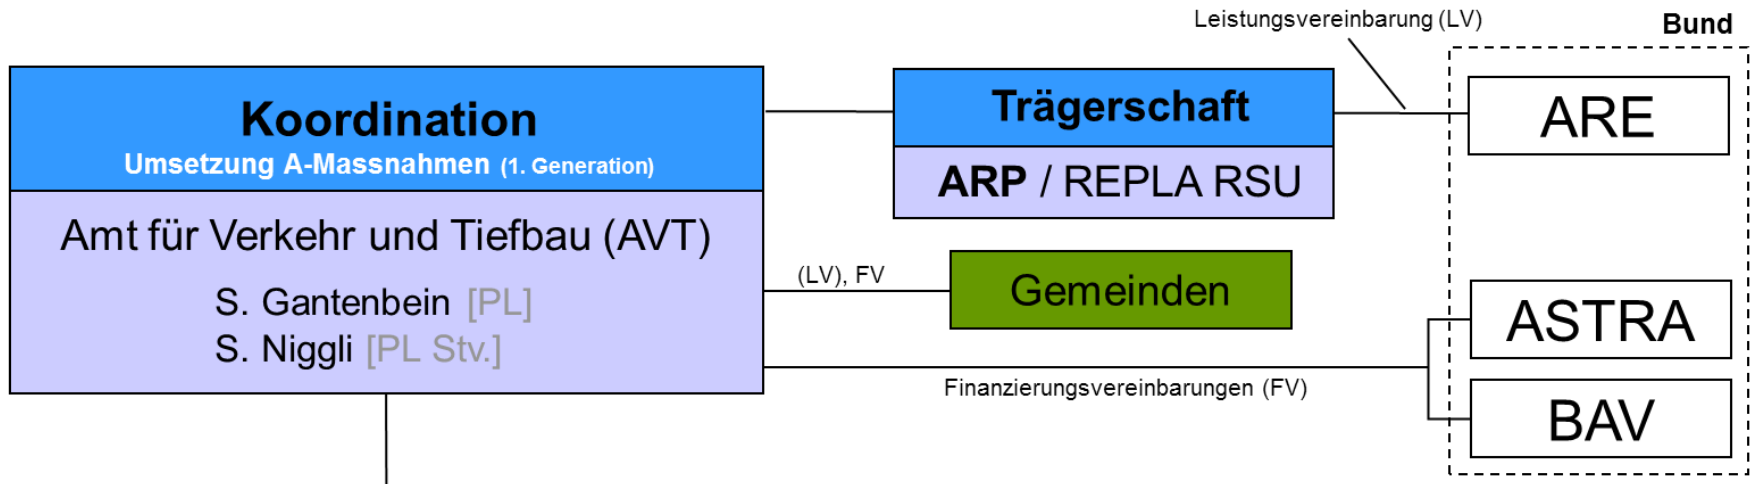

Organigramm

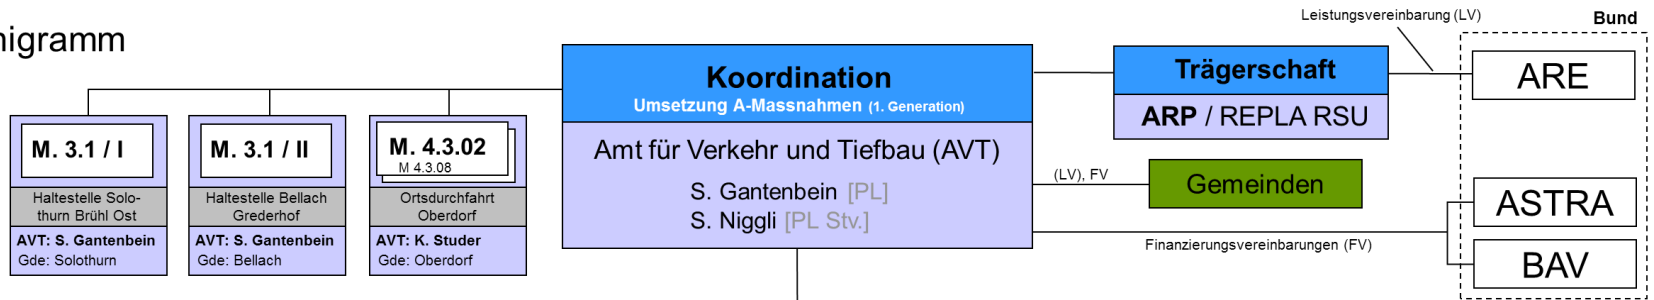

M5: Massnahmen Langsamverkehr

AVT: S. Niggli / S. Gantenbein / K. Erni

M5.1 Erhöhung der Sicherheit auf Kantonsstrassen

M. 5.1.01 M 5.1.02 / M 5.1.16 A/E 4.3.04 - 4.3.06	M. 5.1.05	M. 5.1.07 M. 5.3.10	M. 5.1.08	M. 5.1.9 M 5.2.11 / M 5.3.05	M. 5.1.11	M. 5.1.12	M. 5.1.14
Günsbergstrasse	Kreisel Tell	Kreisel L.-Rütli	Kreuz, Derend.str.	Hauptstr./Waldweg	Bolacker Gerlafinst.	Sportfeld-/Grüttstr.	Rüttenenstrasse
AVT: K. Studer Gde: Hubersdorf, Riedholz	AVT: K. Studer Gde: Bellach	AVT: D. Zoller Gde: Luterbach	AVT: D. Zoller Gde: Luterbach	AVT: D. Zoller Gde: Derendingen	AVT: D. Zoller Gde: Gerlafingen	AVT: D. Zoller Gde: Gerlafingen	AVT: K. Studer Gde: Langendorf

M5.2 Alternativrouten auf Strassen mit geringem MIV

M. 5.2.02	M. 5.2.03	M. 5.2.04	M. 5.2.06	M. 5.2.07	M. 5.2.08	M. 5.2.09	M. 5.2.10	M. 5.2.15
Derendingen-Subingen	Subingen-Kriegstetten	Nennigkofen - Lüsslin. - Solothurn	Zuchwil - Luterbach	Wiladingenstrasse	Solothurn - Selzach	Subingen - Derendingen Süd	Feldbrunnen - Riedholz	Signalisation
AVT: xxx Gde: Derendingen, Subingen, Zuchwil	AVT: xxx Gde: Subingen, Oekingen, Kriegstetten	AVT: xxx Gde: Biberist, Lüss., Nennigkofen, Solothurn	AVT: xxx Gde: Luterbach, Zuchwil	AVT: xxx Gde: Recherswil	AVT: xxx Gde: Solothurn, Bellach, Selzach	AVT: xxx Gde: Subingen, Derendingen	AVT: xxx Gde: Feldbrunnen, Riedholz	AVT: xxx Gden im Wasseramt

M5.3 Verbesserung der Zugänge zu den öV-Haltepunkten für den Fussgänger


M. 5.3.01	M. 5.3.03	M. 5.3.04	M. 5.3.06	M. 5.3.07	M. 5.3.08	M. 5.3.09
Lommiswil: Querung Dorfstr.	V-Beruhigung Oberdorf	Feldbrunnen: asm-Haltestelle	Einmündung Neuquartierstrasse	Gerlafingen: Haltestelle Fluryhof	Hagmannstrasse-Überführungsstr.	Bahnhof Solothurn West
AVT: xxx Gde: Lommiswil	AVT: xxx Gde: Oberdorf	AVT: xxx Gde: Feldbrunnen	AVT: xxx Gde: Biberist	AVT: xxx Gde: Gerlafingen	AVT: xxx Gde: Recherswil	AVT: xxx Gde: Solothurn

05.04.2011/gan

Traktanden:

1. Massnahmen der 1. Generation in der Übersicht
2. Organisation Agglomerationsprogramm Solothurn
- 3. Leistungs- / Finanzierungsvereinbarungen**
4. Umsetzungscontrolling gemäss ASTRA
5. Umsetzungsbericht fürs ARE
6. Aufgaben der Gemeinden
7. Varia

Leistungsvereinbarung:

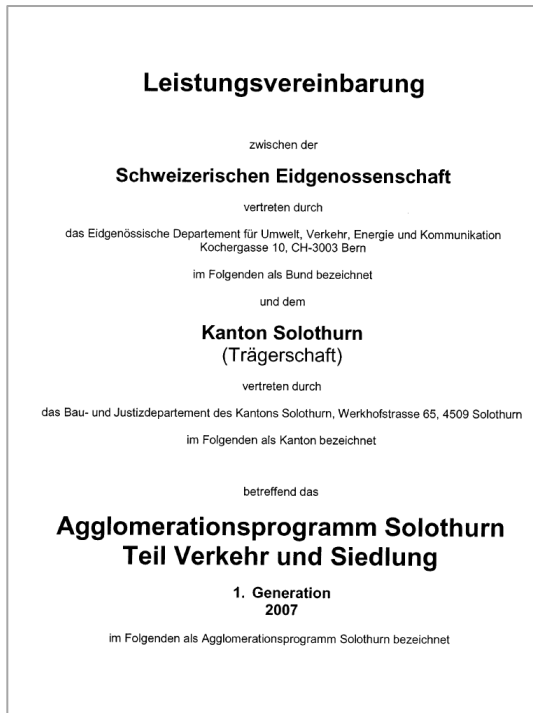

- Bereits erstellt
- Aussagen zu A- und B-Massnahmen sowie Eigenleistungen und Nicht-Infrastrukturelle Massnahmen (Siedlung)
- Grundlage für Umsetzungsbericht

Liste der Massnahmen, Beispiel: Priorität A

Nr.	Massnahme	Kosten Investition [Mio. Fran- ken]; Preisstand Oktober 2005 exkl. MWSt. u. Teuerung	Bundesbei- trag [Mio. Franken]; Preisstand Oktober 2005 exkl. MWSt. u. Teuerung; Höchstbeiträ- ge	Zustän- dige Stelle Bund	Koordinie- rende Stel- le AP (kantonale Stelle)
ARE-Code	Nr. AP				
Schiene					
2601.003	3.1	Verschiebung Bahnhof Bellach	8.68	3.47	BAV SO - AVT
2601.004	3.1	Neuer Haltepunkt Solothurn Brühl Ost	8.68	3.47	BAV SO - AVT
Langsamverkehr					
2601.018		Konzept LV_A-Liste	7.37	2.95	ASTRA SO - AVT
Aufwertungen Ortsdurchfahrten bzw. Sicherheit Strassenraum					
2601.020	M4.3.0 2	Ortsdurchfahrt: Weissen- steinstrasse	1.29	0.51	ASTRA SO - AVT
		Total	26.02	10.40	

Tabelle 3.3

Finanzierungsvereinbarung:

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Strassen ASTRA

Finanzierungsvereinbarung Nr. 11330106

Maximaler Bundesbeitrag CHF 1'540'000.--


Diese Finanzierungsvereinbarung wird geschlossen zwischen
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
vertreten durch
das Bundesamt für Strassen (ASTRA)
3003 Bern,
und
dem Kanton Solothurn,
vertreten durch das
Amt für Verkehr und Tiefbau

Beitragsgeber

Beitragsempfänger

Finanzierungsvereinbarung für das Massnahmenpaket
LV: Alternativrouten auf Strassen mit geringem MIV
ARE Nr. 2601.014
des Agglomerationsprogramms der Agglomeration
Solothurn

427.11.2601.014_20111002_ASTRA_Finanzierungsvereinbarung J.2282-0982

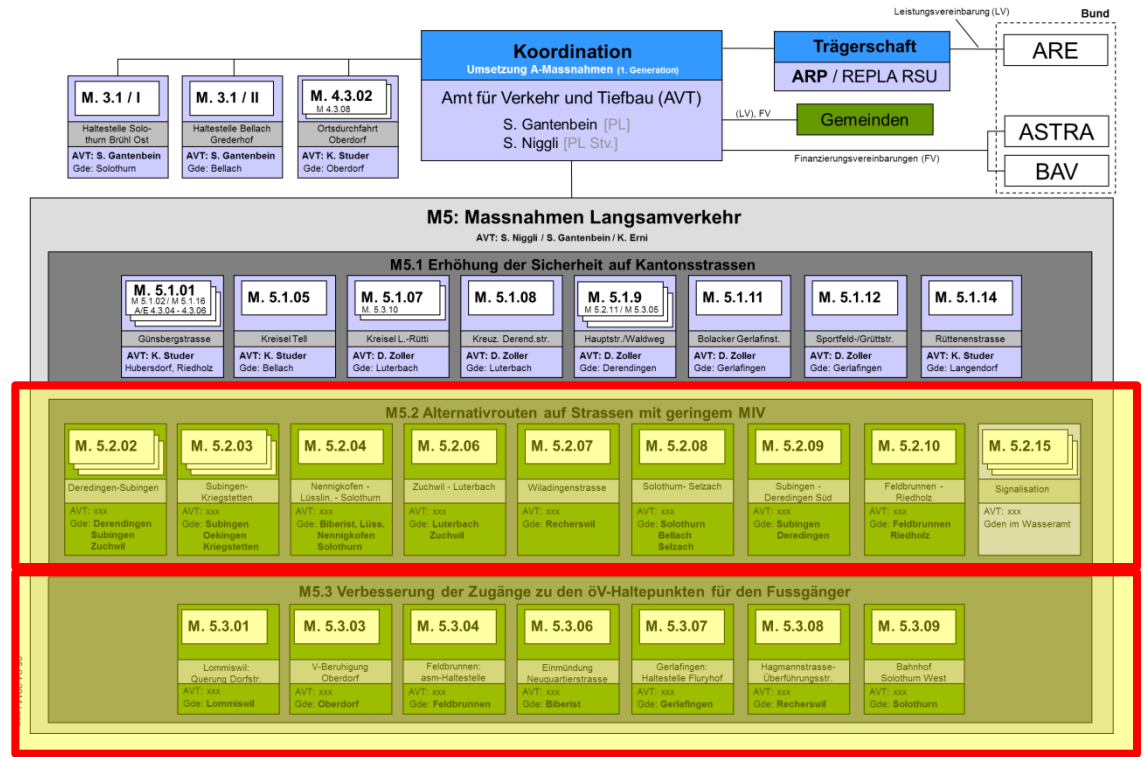


Anforderungen zur Beitragsfestlegung bei Massnahmenpaketen mit bestehender Finanzierungsvereinbarungen:

- Kopie rechtskräftiger Beschluss
- Situationsplan 1:10'000
- Technischer Bericht
- Kostenvoranschlag
- Bauprogramm

Traktanden:

1. Massnahmen der 1. Generation in der Übersicht
2. Organisation Agglomerationsprogramm Solothurn
3. Leistungs- / Finanzierungsvereinbarungen
- 4. Umsetzungscontrolling gemäss ASTRA**
5. Umsetzungsbericht fürs ARE
6. Aufgaben der Gemeinden
7. Varia

Weisungen für Teilaufgaben Strassen- und Langsamverkehr



Beinhalten u. a. folgende Themen:

- Einreichung der Unterlagen zur Beitragszusicherung
- Finanzierungsvereinbarung
- Zahlungsmodalitäten
- Auszahlung Bundesbeiträge
- Controlling
- Teuerung
- Mehrwertsteuer
- ...

Controlling gemäss Vorgaben ASTRA:

- Ziele:
- a. Bewirtschaftung des vom eidgenössischen Parlament gesprochenen Verpflichtungskredits und der vom ASTRA festgelegten Kredite.
 - b. Erstellung des kurz-, mittel- und langfristigen Finanzbedarfs
 - c. Auszahlung der Bundesbeiträge an die Projekte
 - d. Berichterstattung der verwendeten Mittel

Bestandteile:

- A. Termincontrolling / Realisierungsstand
- B. Finanzcontrolling mit Finanzbedarf
- C. Kostencontrolling

A. Termincontrolling / Realisierungsstand

Erforderliche Angaben zu:

- Rechtskräftige Plangenehmigung
- Baubeginn
- Inbetriebnahme
- Projektende
- Baufortschritt (in 5%)
- Kommentierung Realisierungsstand

Jeweils für:

- Plan ▼
- Erwartet / IST ↑



➔ Vorlage «Controlling»:

A. Termincontrolling

Termine	Plan	erwartet / Ist	Realisierungsstand	Ist (per 31.12.)
Rechtskräftige Plangenehmigung			Baufortschritt (in 5%)	0%
Baubeginn			Kommentar: - Entwicklung - Stand - Prognose	
Inbetriebnahme				
Projektende				

Beispiel:


M 5.4.8	Radweg Oberwettstein	Teilprojekt:	
Gemeinde	Wettstein		laufendes Jahr 2012

A. Termincontrolling

Termine	Plan	erwartet / Ist	Realisierungsstand	Ist (per 31.12.)
Rechtskräftige Plangenehmigung	01.08.2011	01.10.2011	Baufortschritt (in 5%)	5%
Baubeginn	01.12.2011	01.12.2011	Kommentar: - Entwicklung - Stand - Prognose	Der Spatenstich ist termingerecht erfolgt. Die ersten Vorarbeiten haben begonnen. Der Projektstand entspricht dem Terminplan.
Inbetriebnahme	30.10.2013	30.10.2013		
Projektende	01.04.2014	01.04.2014		

B. Finanzcontrolling mit Finanzbedarf

- Voranschlag (VA)
- Finanzplan (FP)
- Planrechnung (PR)
- Kommentar Rechnung (Vorjahr n-1)

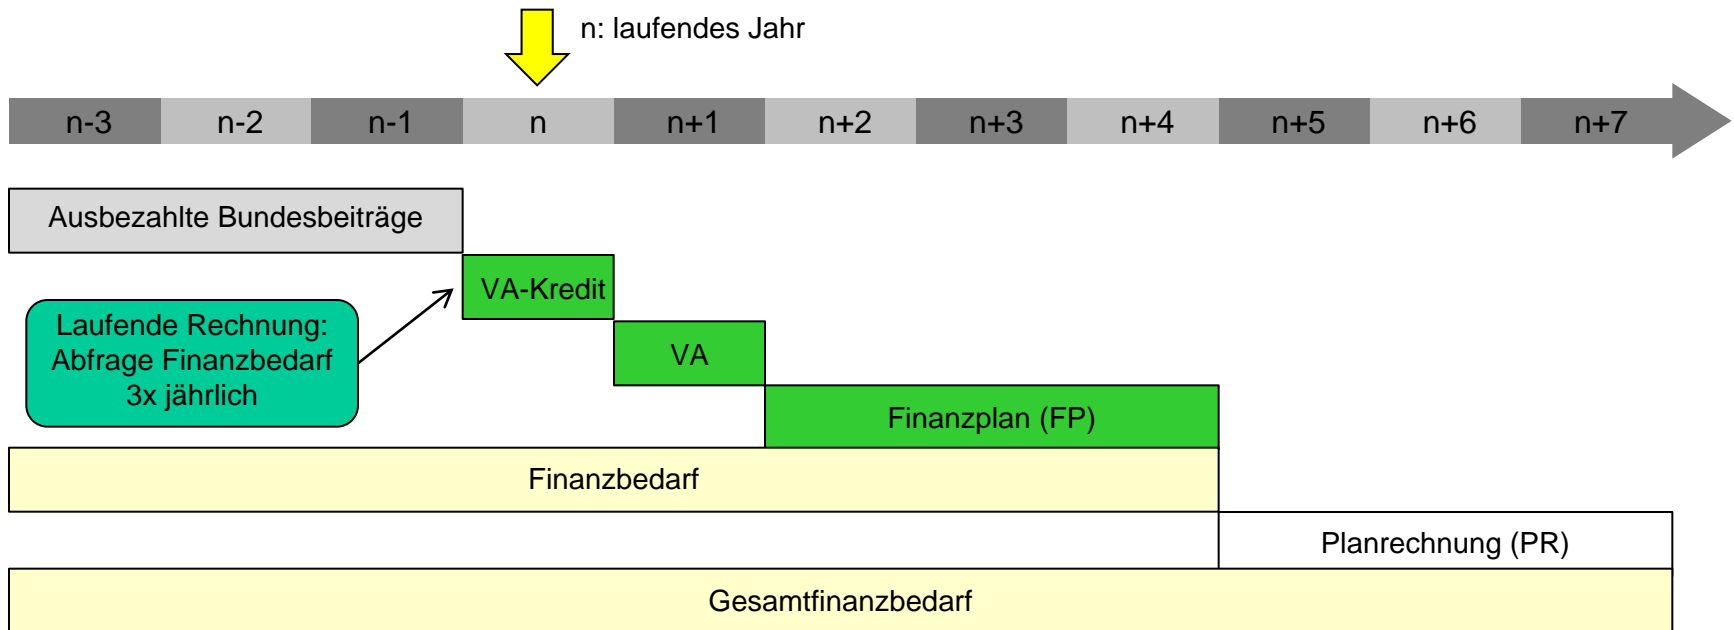

➔ Vorlage «Controlling»:

B. Finanzcontrolling mit Finanzbedarf

Bisherige Zahlungen	2011							Total
Rechnung [CHF]	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundebeitrag [CHF]	-	-	-	-	-	-	-	-
Laufendes Rechnungsjahr	2012		Abfrage I	Abfrage II	Abfrage III	Aktualisierter Finanzbedarf im Rechnungsjahr		
Voranschlagskredit [CHF]			-	-	-			-
Finanzplanung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Voranschlag [CHF]	-							-
Finanzplan [CHF]		-	-	-				-
Planrechnung [CHF]					-	-	-	-
Datum / Visum:								Gesamtfinanzbedarf [CHF]
								-

Beispiel:

B. Finanzcontrolling mit Finanzbedarf

B. Finanzcontrolling mit Finanzbedarf								
Bisherige Zahlungen	2011							Total
Rechnung [CHF]	20'000.00	-	-	-	-	-	-	20'000.00
Bundebeitrag [CHF]	8'000.00	-	-	-	-	-	-	-
Laufendes Rechnungsjahr	2012		Abfrage I	Abfrage II	Abfrage III	Aktualisierter Finanzbedarf im Rechnungsjahr		
Voranschlagskredit [CHF]	120'000.00		110'000.00	-	-			110'000.00
Finanzplanung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Voranschlag [CHF]	65'000.00							65'000.00
Finanzplan [CHF]		25'000.00	-	-				25'000.00
Planrechnung [CHF]					-	-	-	-
Datum / Visum:								Gesamtfinanzbedarf [CHF] 220'000.00

C. Kostencontrolling

- **Kostengrundlage** → Kanton Solothurn 1x jährlich
- **Vergaben** → Gemeinden 1x jährlich
- **Rechnungen** → Gemeinden 2x jährlich
- **Vorvertragsteuerung** → Kanton Solothurn 1x jährlich
- **aufgelaufene Teuerung** → Kanton Solothurn 1x jährlich
- **Mehrwertsteuer** → Kanton Solothurn 1x jährlich
- **Netto- Gesamtkosten** → Kanton Solothurn 1x jährlich

→ Vorlage «Controlling»:

Vergaben

Vertrags- / Offertdatum	Vertrags-Nr.	Bezeichnung	Betrag inkl. MwSt. [CHF]	I: Ingenieur B: Baumeister	0: Grundauftrag 1: Nachtrag

Beispiel:

M 5.4.8	Radweg Oberwettstein	Teilprojekt:						
Gemeinde	Wettstein							

Vergaben

Vertrags- / Offertdatum	Vertrags-Nr.	Bezeichnung	Betrag inkl. MwSt. [CHF]	I: Ingenieur B: Baumeister	0: Grundauftrag 1: Nachtrag
20.04.2010	2503.21	Bauprojekt: Ingenieurbüro Zumstein	35'000.00	I	0
15.08.2010	2503.22	Bauprojekt: Ingenieurbüro Zumstein	10'000.00	I	1
30.08.2011	2510.11	Ausführungsprojekt: Ingenieurbüro Zumstein	25'000.00	I	0
01.10.2011	3100.12	Realisierung: Bauunternehmung Wolf	130'000.00	B	0
30.11.2011	3200.34	Markierung: Unternehmung Marker	20'000.00	B	0
Gesamtvergabesumme [CHF]			220'000.00		

Datum / Visum:

Zusammenfassung «Controlling»

A. Termincontrolling

Termine	Plan	erwartet / Ist	Realisierungsstand	Ist (per 31.12.)
Rechtskräftige Plangenehmigung			Baufortschritt (in 5%)	0%
Baubeginn			Kommentar: - Entwicklung - Stand - Prognose	
Inbetriebnahme				
Projektende				

B. Finanzcontrolling mit Finanzbedarf

Bisherige Zahlungen	2011							Total
Rechnung [CHF]	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundebeitrag [CHF]	-	-	-	-	-	-	-	-
Laufendes Rechnungsjahr	2012		Abfrage I	Abfrage II	Abfrage III	Aktualisierter Finanzbedarf im Rechnungsjahr		
Vorschlagskredit [CHF]			-	-	-			-
Finanzplanung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Vorschlag [CHF]	-							-
Finanzplan [CHF]		-	-	-				-
Planrechnung [CHF]					-	-	-	-
Datum / Visum:						Gesamtfinanzbedarf [CHF]		-

Vergaben

Vertrags- / Offertdatum	Vertrags-Nr.	Bezeichnung	Betrag inkl. MwSt. [CHF]	I: Ingenieur B: Baumeister	0: Grundauftrag 1: Nachtrag

Traktanden:

1. Massnahmen der 1. Generation in der Übersicht
2. Organisation Agglomerationsprogramm Solothurn
3. Leistungs- / Finanzierungsvereinbarungen
4. Umsetzungscontrolling gemäss ASTRA
- 5. Umsetzungsbericht fürs ARE**
6. Aufgaben der Gemeinden
7. Varia

Umsetzungsbericht ARE:

- Umsetzungsbericht (Sinn und Geist, Kohärenz zwischen 1. und 2. Generation)
- Übersicht Massnahmen (Tabellen)

				Massn.-Info		Kostenstand Investitionskosten						Kostenstand Bundesbeitrag		Zeitplanung				Baufortschritt	Vorgesehene Schritte bis zum geplanten Umsetzungsbeginn/Baubeginn						
				Massn.-Kategorie	Angaben Einreichung Agglomeration (2007)	Überprüfung Bund 2009 und Leistungsvereinbarung	Aktueller Stand			Abschluss Projekt lt. Schlussrechnung Finanzierungsvereinbarung	Leistungsvereinbarung	Abschluss Projekt lt. Schlussrechnung Finanzierungsvereinbarung	Umsetzung				Baufortschritt Gesamtmassnahme	Beschrieb der vorgesehenen Schritte und Verfahren, welche bis zum geplanten Umsetzungsbeginn/Baubeginn noch notwendig sind inkl. Termine / Erläuterung wenn nicht realisiert							
BFS-Nr	Kl.	Agglomeration (2000)	Code ARE	Massnahmennummer (Agglo)	Massnahme	Typ (ARE intern)	Kat. (ARE intern)	Kosten Investitionen	Priorität ABC	Kosten (2005 exkl. MVS)	Priorität ABC	Aktuelle Kostenschätzung inkl. Teuerung (Mo.)	inkl. MVS ? (ja=1, nein=0)	Stand aktuelle Kostenschätzung (MMJJJJ)	Kosten (Mo inkl. Teuerung und MVS)	Kosten (2005 exkl. MVS)	Kosten (Mo inkl. Teuerung und MVS)	Datum Abschluss Vorprojekte (MM.JJJJ)	Datum Abschluss Finanzierungsvereinbarung (TT.MM.JJJJ)	Baubeginn (JJJJ)	Abschluss = Schlussabrechnung (JJJJ)	Inbetriebnahme (JJJJ)	%	Erläuterungen (max. 10 Zeilen pro Massnahme bei ca. 10 cm Spaltenbreite- und Schriftgrösse 10)	
2601	M	2601 Solothurn	2601.003	3.1	Verschiebung Bahnhof Belach	1h	1	10	A	8.68	A				3.47										
2601	M	2601 Solothurn	2601.004	3.1	Neuer Haltepunkt Solothurn Brühl O	1h	1	10	A	8.68	A				3.47										
2601	M	2601 Solothurn	2601.020	IM.3.02	Ortsdurchfahrt: Weissensteinstr.	2s	7	1.5	A	1.29	A				0.51										
2601	M	2601 Solothurn	2601.018	0.0	Konzept LV_A-Liste	3be	3	8.60	0.00	7.37	A				2.95										

Bemerkungen/Erläuterungen zur Tabelle / Remarques/explications concernant le tableau

füllt ARE vorweg aus / rempli au préalable par l'ARE

ist von Agglomeration auszufüllen / est rempli par l'agglomération

wird von IF-Administration ausgefüllt werden / sera rempli par l'administration du Fonds d'infrastructure

- Umsetzungsstand
- Aktueller Kostenstand
- Erläuterungen

Traktanden:

1. Massnahmen der 1. Generation in der Übersicht
2. Organisation Agglomerationsprogramm Solothurn
3. Leistungs- / Finanzierungsvereinbarungen
4. Umsetzungscontrolling gemäss ASTRA
5. Umsetzungsbericht fürs ARE
6. Aufgaben der Gemeinden
7. Varia

Aufgaben der Gemeinden:

- > Zur Beitragsfestlegung einer Massnahme (vor Realisierung):
 - ➔ Gesuchsunterlagen (gemäss Anforderungen Folie 18) mindestens 3 Monate vor Baubeginn dem AVT einreichen.
 - ➔ Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung Kanton ↔ Gemeinde

- > Controlling bei Massnahmen in der Realisierung:
 - ➔ A. Termincontrolling: 25. Januar 2012
 - ➔ B. Finanzcontrolling: 25. Januar 2012
 - ➔ C. Vergaben: 25. Januar 2012

Info: Jahreskalender (Aggloprogramm) in Bearbeitung beim Kanton

Traktanden:

1. Massnahmen der 1. Generation in der Übersicht
2. Organisation Agglomerationsprogramm Solothurn
3. Leistungs- / Finanzierungsvereinbarungen
4. Umsetzungscontrolling gemäss ASTRA
5. Umsetzungsbericht fürs ARE
6. Aufgaben der Gemeinden

7. Varia
